# UNIVERZITET DŽEMAL BIJEDIĆ U MOSTARU FAKULTET INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA MOSTAR

#### **SEMINAR**

# Projekat: Unapređenje informacionog sistema na primjeru jedne kompanije

Student: *Ernad Husremović*, *DL 2792*Mentor: *prof.dr Murat Prašo* 

ver: 1.0.1

# SADRŽAJ

Po	pis ta	blica	iv
Po	pis sli	ika	v
1.	Uvo	d	1
	1.1.	Uticaj akcije legalizacije na promjene na IT tržištu BiH	1
	1.2.	Open source software u BiH	1
		1.2.1. Ubuntu Linux	2
		1.2.2. Razlike između otvorenog i zatvorenog software-a	2
		1.2.3. "F18 knowhowERP" software	3
2.	Ana	liza	4
	2.1.	Profil korisnika projekta	4
	2.2.	Analiza problema	5
	2.3.	Definisanje ciljeva projekta	6
	2.4.	Logički okvir projekta	6
3.	Upra	avljanje projektom	7
	3.1.	Tehnički aspekti	7
	3.2.	Vremenski aspekti	8
	3.3.	Identifikacija rizika	8
		3.3.1. Strategija odgovora na pojedinačne rizike	9
	3.4.	Planiranje resursa	10
		3.4.1. Materijalni resursi	10
		3.4.2. Ljudski resursi	10
	3.5.	Finansijski aspekti	12
		3.5.1. Budžet projekta	12
		3.5.2. Finansiranje projekta	12
		3.5.3. Ocjena opravdanosti investicije	13

4.	Zaključak	14
5.	Literatura	15
Α.	Korišteni software	10
В.	Bilješke	1

# POPIS TABLICA

2.1.	Logički okvir projekta	6
3.1.	Tabelarni pregled projektnih zadataka	8
3.2.	Lista rizika po prioritetima	ç
3.3.	Prevencija i kontrola rizika	9
3.4.	Pregled materijalnih resursa	10
3.5.	Pregled ljudskih resursa	11
3.6.	Pregled ukupnih troškova angažovanja resursa	12
3.7.	Dinamika plaćanja	12
3.8.	Kalkulacija opravdanosti investicije	13

# POPIS SLIKA

2.1.	Piramida problema	5
2.2.	Piramida cilja	6
3.1.	Gantogram projekta	8
3.2.	Pregled alokacije ljudskih resursa	11

Projekat: Unapređenje informacionog sistema na primjeru jedne kompanije

Sažetak

Ovaj rad prikazuje projekat unapređenja poslovnog informacionog sistema (IS) u kompaniji koja trenutno posjeduje IS baziran na nelegalnom software-u. Novi IS je baziran na software-u otvorenog koda (engl. *open source software, OSS*). Pored standardnih OSS aplikacija, za komponentu poslovnog rješenja korišteno je "F18 knowhowERP" programsko rješenje kompanije "bring.out" doo Sarajevo. "F18" je multiplatformski OSS software. U radu su detaljno objašnjenje prednosti i nedocstaci uvođenja takvog IS-a. Izvršena je analiza svih bitnih aspekata realizacije takvog projekta, kako tehnič-

**Ključne riječi:** projekat, software otvoreng koda, OSS, multiplatformski sofver, poslovne aplikacije, F18, ERP, bring.out, informacioni sistem, IS

kih i tako i ekonomskih.

**Project: Improvement of the information system - Case study** 

**Abstract** 

This report presents the details of the project which aimed to improve business business information system (IS) in a company which currently owns an IS based on an illegal software. The new IS was designed as an open platform. Appart of the standard applications tis project also incorporated ERP (Enterprise resource planning) software component "F18 knowhowERP", produced by "bring.out" doo Sarajevo. "F18" is an OSS multiplatform software. This report explains what OSS represents for the user with all advantages and risks. The detailed analysis conaining all relevant aspects of the project is also presented.

**Keywords:** project, open source software, OSS, multiplatform software, business application, F18, ERP, bring.out, information system, IS, illegal software

# 1. Uvod

# 1.1. Uticaj akcije legalizacije na promjene na IT tržištu BiH

Akcije državnih inspekcijskih organa na suzbijanju nelegalnog software-a (nadalje legalizacija) sa početkom 2012 godine označila je početak krupnih promjena na tržištu informatičkih (engl. *information technology, nadalje IT*) rješenja u Bosni i Hercegovini. Većina poslovnih subjekata koja je proteklih godina koristila nelegalni software (engl. *software*) našla se u nezavidnoj situaciji. Usljed visokih troškova legalizacije "Microsoft" sofware-a<sup>1</sup>, pojavila se potražnja za software-om drugih proizvođača.

#### 1.2. Open source software u BiH

Preduzeće "bring.out"<sup>2</sup> je dugi niz godina orjentisano na ponudu sistema baziranih na software-u otvorenog koda (engl. *open source software, nadalje OSS*). Potražnja za Linux/Ubuntu serverskim rješenjima <sup>3</sup>) je postojala i prije legalizacije. Međutim, tek nakon legalizacije pojavila se potražnja za cjelovitim informatičkim IT rješenjima baziranim na OSS-u:

- server operativni sistem (nadalje OS)
- desktop operativni sistem
- aplikativni software
  - opći software za uredske potrebe
  - poslovni software za podršku tekućim operacijama kompanije (engl. Enterprise Resource Planning, nadalje ERP)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>familija "Microsoft Windows" OS-ova, uz svuda prisutni ali i redovno nelegalno instalirani "Microsoft Office" uredski paket

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>http://www.bring.out.ba/

http://linux.com, http://ubuntu.com

#### 1.2.1. Ubuntu Linux

"Ubuntu Linux" distribucija je radi svoje jednostavnosti i kvaliteta postao iznimno popularan desktop OS. Za razliku od "Windows" operativnih sistema, "Ubuntu" desktop sistem sadrži kompletan set aplikacija za svakodnevne potrebe:

- LibreOffice uredski paket za pravljenje tekstualnih i tabelarnih dokumenata, prezentacija i crteža<sup>4</sup>
- "Inkscape", program za vektorsku grafiku Hiitola (2011)
- "GIMP", program za bitmapiranu grafiku
- "Evince", preglednik PDF dokumenata
- "Firefox", "Chromium" internet pretraživači
- "OpenProj", program za izradu i praćenje projekata<sup>5</sup>

#### 1.2.2. Razlike između otvorenog i zatvorenog software-a

Lista iz predhodne sekcije predstavlja djelimičnu listu aplikacija dostupnih za "Ubuntu". Međutim, i to je dovoljno da se uoči bitna razlika između "Windows"-a i "Ubuntu"-a:

- 1. Uz "Windows" početni paket se isporučuje samo operativni sistem, dok "Ubuntu" (kao i ostale Linux distribucije) isporučuju kompletan sistem koji korisnik može odmah početi koristiti.
- 2. Razvoj "open source" software-a je suštinski drugačiji u odnosu na razvoj zatvorenog sofvera Raymond (1999). Kod zatvorenog software-a sve ključne razvojne aktivnosti i sudbina software-a nalaze se u rukama jednog proizvođača. Kod OSS-a postoji velika uključenost zajednice korisnika (engl. *community*), što omogućava da se sve komponente software-a razvijaju u skladu sa potrebama i zahtjevima korisnika.
- 3. U ranom stadiju razvoja OSS software je manjkao sa kvalitetnom dokumentacijom. Sada to nije slučaj. Korisnicima je na raspolaganju velika količina dokumentacije koja se takođe razvija na principima otvorenosti. Tako korisik "Ubuntu" sistema na raspolaganju ima odličnu dokumentaciju za serverske community (2012a) i desktop community (2012b) sistem.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>U funkcionalnom smislu sličan "Microsoft office" setu aplikacija. Može obrađivati većinu "Microsoft office" dokumenata

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>U funkcionalnom smislu sličan "Microsoft project" aplikaciji

4. Zahvaljujući otvorenosti, lokalizacija programa i korisničke dokumentacije (prevod i prilagodbe za lokalno tržipte) za OSS nije vođena samo komercijalnim motivima. S druge strane lokalizacija "Microsoft" proizvoda ovisi isključivo o komercijalnim faktorima. Zato je stepen lokalizacije "Microsoft" software-a na malim tržištima kakvo je naše minimalan.

U mnogim zemljama postoje jake zajednice korisnika koje lokalizaciju "open source" software-a vrše na bazi volonterizma. Kako se radi o projektima od velikog javnog značaja, te zajednice su često finansirane od strane države. Svijetli primjeri država u regionu u kojima postoje jake zajednice FOSS (engl. *Free and open source software*) & OSS korisnika su Makedonija i Slovenija. Na žalost, Bosna i Hercegovina, kao i u većini stvari, na tom planu zaostaje.

#### 1.2.3. "F18 knowhowERP" software

Pored standardnih komponentni "Ubuntu" OS-a, za ERP software je korišten "F18" knowhowERP software.

"F18" knowhowERP<sup>6</sup> je multiplatformsko "open source" ERP rješenje, proizvod firme "bring.out". Predhodnik "F18" je programsko rješenje "FMK" koje se na lokalnom tržištu koristi od 1994 godine. "F18" je software pravljen od Bosanaca za BiH tržište. "F18" je u cjelosti domaći proizvod.

Na osnovu svega što je do sada izloženo, bosanskom klijentu je moguće ponuditi cjelovito OSS IT rješenje. Ovaj projekat će obuhvatiti instalaciju jednog takvog sistema kod klijenta.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>http://redmine.bring.out.ba/projects/f18

# 2. Analiza


## 2.1. Profil korisnika projekta

Korisnik je mala kompanija koja se bavi trgovinom. Sa stanovišta IT-a kompanija se sastoji od:

- maloprodajna mreža od 5 prodavnica
- centrala kompanije sa knjigovodstvom, 4 radne stanice
- 1 server baze podataka

#### 2.2. Analiza problema


Glavni razlog zbog kojeg se klijent obratio bila je potreba da uvede legalni software. Analiza postojećeg stana urađena je uz pomoć modela piramide problema (Prašo (2005)). Model piramide problema omogućava hijerarhijski prikaz problema od općih ka konkretnim:

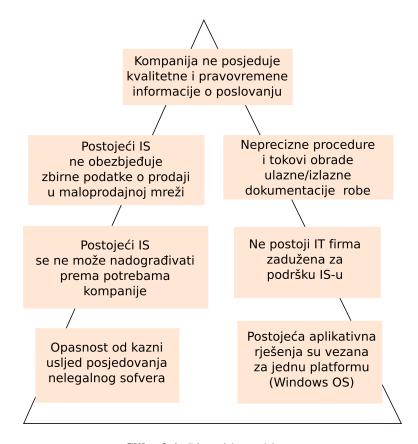

Slika 2.1: Piramida problema

#### 2.3. Definisanje ciljeva projekta

Na osnovu analize problema definisana je piramida ciljeva projekta:

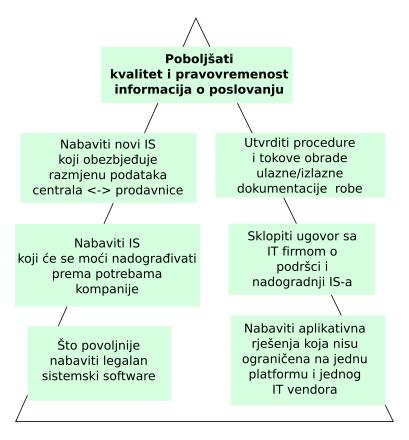

Slika 2.2: Piramida cilja

Strateški cilj je poboljšati pravoremenost i kvalitet tekućih informacija o poslovanju kroz uvođenje novog IS-a.

#### 2.4. Logički okvir projekta

Na kraju analize dolazimo do ključnih odrednica projekta:

Svrha projekta: Unapređenje poslovanja kompanije obezbjeđenjem kvalitetnijih informacija o poslov			
Cilj: Uvođenje novog informacionog sistema			
Ulazi projekta: Postojeći informacioni sistem, postojeća organizacija poslovanja			
Izlazi projekta: Unapređeni informacioni sistem, unapređena organizacija poslovanja			

**Tablica 2.1:** Logički okvir projekta

# 3. Upravljanje projektom

Upravljanje podrazumjeva uvid i praćenje svih bitnih aspekata projekta:

- tehničkih
- vremenskih
- finansijskih
- identifikacija rizika
- planiranje ljudskih i materijalnih resursa

## 3.1. Tehnički aspekti

Komponente za realizaciju IS-a su multiplatformski i "open source" sofware:


- Desktop OS: Ubuntu Linux 12.04 32bit
- Server OS: Ubuntu Linux 12.04 64bit
- Uredski software: LibreOffice 3.5
- Sofware za podršku poslovanju: knowhow ERP F18
- Baza podataka: PostgreSQL 9.1

Postojeći hardware klijenta je dobrih karakteristika, tako da će biti u potpunosti iskorišten.


#### 3.2. Vremenski aspekti

Dinamika realizacije projekta je utvrđena tokom preliminarnih razgovora sa klijentom. Kao okvirno vrijeme dogovoren je 1 mjesec za realizaciju uz dodatnih 2-3 mjeseca označenih kao period stabilizacije sistema.

Napravljeni dinamički plan je u skladu sa ranijim dogovorom.

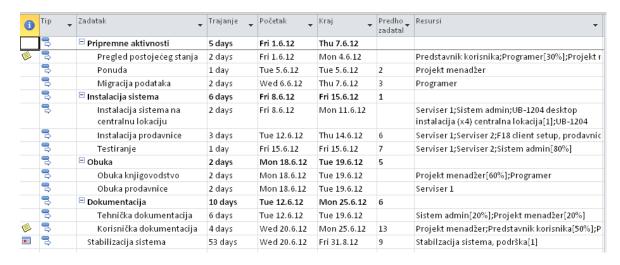

Tablica 3.1: Tabelarni pregled projektnih zadataka



Slika 3.1: Gantogram projekta

Vrijeme realizacije je 3 mjeseca, period realizacije 01.06.2012 - 31.08.2012.

## 3.3. Identifikacija rizika

Identifikacijom i kvantifikacijom rizika napravljena je tabela rizika:

Oznaka	Rizik	Opis	Prioritet
R1	Promjena navika kod	Novi IS pretpostavlja potpunu zamjenu	Visok
	korisnika	software-a: od desktopa do ERP rješenja	
R2	bring.out je jedini OSS	Iako su tehnologije koje se implementiraju	Visok
	IT vendor na bosan-	otvorene, na BH tržištu ne postoje drugi ven-	
	skom tržištu	dori koji nude slična rješenja	
R3	Onemogućen pristup	IT rješenja državnih institucija u većini pret-	Visok
	aplikacijama državnih	postavljaju korištenje Windows OS-a	
	institucija		
R4	Ponuđeno ERP rješenje	Opasnost da će klijent F18 knowhow ERP	Srednji
	neće zadovoljiti potrebe	percipirati kao neadekvatno ERP rješenje	
	klijenta		
R5	Neredovno finansiranje	Klijent neće moći obezbjediti redovno finan-	Srednji
	projekta	siranje projekta iz tekućih izvora	

Tablica 3.2: Lista rizika po prioritetima

#### 3.3.1. Strategija odgovora na pojedinačne rizike

U sljedećoj tabeli dajemo prikaz preventivnih i akcija kontrole za identificirane rizike:

Oznaka	Preventivne i kontrolne akcije
R1	Veću pažnju posvetiti obuci korisnika
R2	Otvorenim pristupom klijentu pokazati klijenti da se odnosi da odnosi na rela-
	ciji otvoreni IT vendor <-> klijenta grade na partnerskog osnovi, a ne na bazi
	monopoliziranja znanja.
R3	Aktivnim djelovanjem prema državnim institucijama obezbjediti da korisnici
	otvorenih sistema budu u istoj poziciji kao korisnici "Windows"-a
R4	IT vendor se treba aktivno uključiti u probleme i potrebe korisnika, pomoći mu
	da organizuje poslovanje u skladu sa glavnim ciljevima IS-a, uzevši u obzir da
	je softver samo alat.
R5	Zajedno sa klijentom definisati najprihvatljiviji finansijski plan za obje strane,
	a što je moguće upravo zahvaljujući činjenici da IT vendor nudi sopstvene
	proizvode i nije limitiran rokovima plaćanja prema svojim dobavljačima.

Tablica 3.3: Prevencija i kontrola rizika

#### 3.4. Planiranje resursa

#### 3.4.1. Materijalni resursi

Pregled materijalnih resursa:

ne resursa 🔻	Tip T	Max. Units	Cijena korištenja 🕌	Obračun troška:
UB-1204 desktop instalacija (x4) centralna Iokacija	Material		320,00 KM	Prorated
UB-1204 desktop instalacija (x5) prodavnice	Material		400,00 KM	Prorated
UB-1204 server instalacija	Material		350,00 KM	Prorated
F18 client setup, prodavnica (x5)	Material		600,00 KM	Prorated
F18 client setup, knjigovodstvo (x4)	Material		320,00 KM	Prorated
F18 server setup	Material		220,00 KM	Prorated
Ubuntu radna stanica internet podrška (x5) centrala	Material		250,00 KM	Prorated
Ubuntu radna stanica internet podrška (x5) prodavnica	Material		250,00 KM	Prorated
Stabilzacija sistema, podrška	Material		1.000,00 KM	Prorated

**Tablica 3.4:** Pregled materijalnih resursa


Treba naglasiti da se u slučaju "open source" sofvera ne radi o "klasičnim" materijanim resursima. Kod OSS-a prodaja licenci za korištenje kao troškovna stavka ne postoji. Klijent plaća instalaciju i podešenje sistema davaocu IT usluga (engl. *IT vendor, IT provider*). S obzirom da su cijene tih usluga normirane, te usluge je najpogodnije u projektu izraziti kao materijalne resurse.

Posebna ćemo prokomentarisati stavku "Stabilizacija sistema, podrška". Ova stavka predstavlja iznos ugovora o podršci u periodu stabilizacije sistema koji traje cca 2-3 mjeseca. U tom periodu se očekuju intenzivne aktivnosti servisnog i programerskog tima na rješavanju zahtjeva novog korisnika. Iako bi se moglo reći da ova stavka pripada periodu eksplotacije projekta, mi smo je radi preglednosti uvrstili unutar realizacije projekta. Zato je zadatku "Stabilizacija" u projektnom planu alociran samo ovaj materijalni resurs.


Sveukupno, podjelu na radne i materijalne resurse u ovom projektu treba uzeti uslovno. Projekat praktično ne sadrži prave materijalne resurse.

#### 3.4.2. Ljudski resursi

Pregled ljudskih resursa (projektni tim) potrebnih za realizaciju projekta: Raspored tima tokom realizacije projekta:



Tablica 3.5: Pregled ljudskih resursa



Slika 3.2: Pregled alokacije ljudskih resursa

Radi planiranja sastanaka uvršten je predstavnik klijenta. Zbog pravilne kalkulacije troškova sa stanovišta klijenta, troškovi predstavnika su 0 KM/h.

## 3.5. Finansijski aspekti

#### 3.5.1. Budžet projekta

	Resource Name	Trošak 🕌
1	Projekt menadžer	873,60 KM
2	Serviser 1	384,00 KM
3	Serviser 2	192,00 KM
4	Programer	528,00 KM
5	Sistem admin	236,80 KM
6	Predstavnik korisnika	0,00 KM
7	UB-1204 desktop instalacija (x4) centralna lokacija	320,00 KM
8	UB-1204 desktop instalacija (x5) prodavnice	400,00 KM
9	UB-1204 server instalacija	350,00 KM
10	F18 client setup, prodavnica (x5)	1.200,00 KM
11	F18 client setup, knjigovodstvo (x4)	0,00 KM
12	F18 server setup	220,00 KM
13	Ubuntu radna stanica internet podrška (x5) centrala	250,00 KM
14	Ubuntu radna stanica internet podrška (x5) prodavnica	250,00 KM
15	Stabilzacija sistema, podrška	1.000,00 KM

Tablica 3.6: Pregled ukupnih troškova angažovanja resursa

Ukupni troškovi realizacije projekta, uključujući fazu stabilizacije su **6204,40 KM**. Navedeni su iznosi neto, bez uračunatog PDV-a.

#### 3.5.2. Finansiranje projekta

Prodavac i klijent su dogovorili sjedeću dinamiku plaćanja:

Pozicija	preduslov za plaćanje	Vrijeme	Iznos (KM) bez PDV
Avans:	-	01.06.2012	2000
Instalacija:	po okončanoj instalaciji	01.07.2012	2000
stabilizacija 1	aktivna podrška klijentu	01.08.2012	1000
stabilizacija 2	aktivna podrška klijentu	31.08.2012	1204.40
		UKUPNO:	6204.40

Tablica 3.7: Dinamika plaćanja

Ova dinamika omogućava klijentu da iz sopstvenih izvora (tekućih operativnih prihoda poslovanja Prašo (2003)) finansira projekat.

#### 3.5.3. Ocjena opravdanosti investicije

Analizu opravdanosti investicije bazirana je komparaciji sa alternativnimi rješenjem problema u kome korisnik jedino plaća troškove legalizacije postojećeg sistemskog sofvera. Stoga u kalkulaciju nisu uzeti troškovi legalizacije uredskog "Microsoft office" software-a, niti nabavka novog ERP rješenja.

Kada bi se te stavke uvrstile u kalkulaciju opravdanosti, interna stopa rentabilnosti bi bila puno veća. Međutim, čak i u ovom konzervativnom scenariju troškova, naš projekat ima visoku internu stopu rentabilnosti od **36,9**%, što nam sljedeća kalkulacija pokazuje:

	Α	В	С	D	E
1					
	Troškovi redovne podrške postojećeg sistema (KM/mjesečno):	120			
2	Troškovi redovne podrške sistema novog IS-a (KM/mjesečno):	170			
3	Procjena ušteda postignutih uvođenjem novog IS-a (kvalitetnije informacije o stanju zaliha, manje manuelnog rada) kroz umanjenje prekovremenog rada zaposlenih				
4	, , ,				
5	Kamatna stopa za diskontovanje (%):	10			
6		Period investiranja	Pe	riod eksploatad	ije
7		-1	0	1	2
8	Troškovi (T)	6886	2040	2040	2040
9	Korist (K)	4900	3240	3240	3240
10	Bruto primici (BP)	-1986	1200	1200	1200
11	Diskontovani - neto primici (NP)	-2185	1200	1091	992
12	Sadašnja vrijednost projekta (SV)				1098
13	Interna stopa rentabilnosti				0,369
14					
15	Stopa kojom se sadašnja vrijednost projekta svodi na 0 je 3 od ove vrijednosti, investicija u projekat je <b>opravdana</b>	6,9%. S obzirom da	su kamatne sto	ppe na štednju	znatno manje
16	od ove vrijednosti, irivesticija u projekat je <b>opravdana</b>				
17	Troškovi legalizacije	Cijena	Količina	Ukupno	
18	Windows desktop OS	400	9	3600	
19	Windows Server OS	1000		1000	
20	Client access licence za pristup Windows Serveru	300	1	300	
21				4900	

Tablica 3.8: Kalkulacija opravdanosti investicije

# 4. Zaključak

Finansijski indikatori iz prethodnog poglavlja jasno kazuju da je predloženo IT rješenje u finansijskom smislu isplativa opcija. Troškovi licenci IS-a izgrađenog sa zatvorenim software-om (engl. *proprietary software*) su tako veliki, da će većina bosanskih poslovnih korisnika na licence potrošiti višegodišnji IT budžet. U tom slučaju budžetom se ne mogu predvidjeti sredstva za obuku, nadogradnju i kvalitetnu podršku IT sistemu. Smatramo će takvi korisnici, korisnici sa skromnim IT budžetom, u većini slučajeva dobiti bolji IS nabavkom otvorenog sistema. To vrijedi čak i u slučajevima kada su pojedinačne komponente zatvorenog IS-a superiorne u odnosu na otvoreni sistem.

Poslovni IT sistemi su složeni i dinamični sistemi. Ako korisnik nakon kupovine licenci ne može obezbjediti kvalitetnu obuku za osoblje i podršku, velika je vjerovatnoća da će konačnici dobiti sistem loših performansi, bez obzira što su pojedinačne komponente superiorne u odnosu na odgovarajući otvoreni sistem.

Na primjer, za najveći broj bosanskih poslovnih korisinika puno je bolje investirati u obuku za rad sa "LibreOffice"-om (LO) nego li kupovati licence za "Microsoft office" (MSO). Nakon kratke obuke, prosječan korisnik će sve poslove koje je obavljao sa MSO obavljati u LO istom brzinom i sa istim kvalitetom.

Naposlijetku, korištenje otvorenih sistema korisnicima otvara nove mogućnosti kod razvoja i nadogradnje IS-a. Pored činjenice da je naš software iz primjera "LibreOffice" u poređenju sa "Microsoftovim" rješenjem dovoljno dobar (engl. *good enough*), on ima jednu veoma bitnu prednost: "LibreOffice" je **multiplatformski** software. To znači da se LO može instalirati na različite platforme - različite operativnim sistema.

Multiplatformski software omogućava da se IS nadograđuje sa puno više slobode, što u finansijskom smislu redovno znači - puno jeftinije. Takva heterogena sistemska okruženja su s razlogom već postala standard u savremenim svjetskim IS-ovima.

# 5. Literatura

Ubuntu community. *Ubuntu desktop priručnik*, 2012a. URL https://help.ubuntu.com/12.04/ubuntu-help/index.html.

Ubuntu community. *Ubuntu server priručnik*, 2012b. URL https://help.ubuntu.com/12.04/serverguide/serverguide.pdf.

Bethany Hiitola. *Inkscape 0.48 Essentials for Web Designers: LITE*. Packt Publishing, 2011.

Murat Prašo. *Poslovni reporting*. Univerzitetska knjiga Mostar, 2003.

Murat Prašo. Uvod u upravljanje projektom. Univerzitetska knjiga Mostar, 2005.

Eric S. Raymond. The Cathedral and the Bazaar: Musings on Linux and Open Source by an Accidental Revolutionary. O'Reilly Media, 1999. URL http://www.catb.org/~esr/writings/cathedral-bazaar/cathedral-bazaar/index.html.

# **Dodatak A**

# Korišteni software

software korišten za realizaciju ovog dokumenta:

- 1. Mac OS X 10.6.8
- 2. Ubuntu Linux 12.04 Unity, 64bit
- 3. mvim, vim tekst editor ver 7.3
- 4. MacTex pdfTeX 3.1415926-2.3-1.40.12 (TeX Live 2011)
- 5. Windows XP Proffesional<sup>1</sup> on VirtualBox 4.1.16 MacOSX
- 6. Microsoft Project 2010, trial, ProductID 02252-552-2789414-37542
- 7. LibreOffice 3.5.4
- 8. Inkscape 0.4.8, Mac OSX X11

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>kupac "bring.out" u sklopu MSDN Universal paketa, developer Ernad Husremović

# Dodatak B Bilješke

- izvorni kod dokumenta, https://github.com/hernad/FIT\_PRO/blob/ master/latex/PRO\_F18.tex
- Dokumenta u PDF formatu, https://github.com/hernad/FIT\_PRO/ raw/master/latex/PRO\_F18.pdf
- MS Project dokument https://github.com/hernad/FIT\_PRO/raw/
  master/F18\_ubuntu\_projekat.mpp
- Calc dokument, kalkulacija opravdanosti investicije https://github.com/ hernad/FIT\_PRO/raw/master/F18\_ubuntu\_projekat.ods
